

Progetto

IPS

Italiadomani

LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI-CALLEGARI"

VIA UMAGO n.18 - RAVENNA

FUTURA

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR, M2, C3, I1.1

CUP: J61B22000110006

ENTE PROPONENTE: PROVINCIA DI RAVENNA

Committente

Provincia di Ravenna

Livello di progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato	Scala	Data
Cronoprogramma	-	15/06/2023
Codice elaborato		
PE_GEN_21_CRONO_r.00		
Nome file sorgente		
Estensione		
PE_GEN_21_CRONO_r.00		
Nome file archiviazione		
Estensione		
Dim. Foglio		
PE_GEN_21_CRONO_r.00		
pdf		
210x297 mm		

Spazio per firme e timbri

Progettista coordinatore:

Arch. Filippo Pambianco

Cavejastudio

Responsabile unico del Procedimento:

Ing. Paolo Nobile

Provincia di Ravenna

FIRMATO DIGITALMENTE

Timbro e firma del Professionista

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Nobile

Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data
00	Emissione	FP	PN	PN	15/06/2023
01	Revisione	--	--	--	00/00/0000
02	Revisione	--	--	--	00/00/0000
03	Revisione	--	--	--	00/00/0000
04	Revisione	--	--	--	00/00/0000
05	Revisione	--	--	--	00/00/0000
06	Revisione	--	--	--	00/00/0000

PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza dei Caduti per la Libertà 2

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Presidente

Michele de Pascale

Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica

Maria Luisa Martinez

Dirigente responsabile del Settore

Ing. Paolo Nobile

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Nobile

PROGETTISTA COORDINATORE

Arch. Filippo Pambianco

PROFESSIONISTI RTP

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Filippo Pambianco

Arch. Alessandro Pretolani

Arch. Giorgio Granatiero

Progettista delle opere strutturali

Ing. Gilberto Sarti

Progettisti impianti elettrici e meccanici

Structura Engineering

Progettista antincendio

Ing. David Negrini

Progettista acustico

NORUMORE

Coordinamento sicurezza

Ing. Emanuele Cantoni

**PROVINCIA DI RAVENNA**

**Cronoprogramma di PROGETTO**

**OGGETTO:** PROGETTO I.P.S. OLIVETTI-CALLEGARI

**COMMITTENTE:**


, 15/06/2023

Il Tecnico  
( )

---

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	2023			2024			2025			2026			2027																	
				Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb
1	AGGIUDICAZIONE LAVORI	126 g	0,00																														
2	GARA D'APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI	126 g	0,00																														
3	LAVORI	524 g	4'910'000,00				01/03/2024			LAVORI						31/03/2026																	
4	DEMOLIZIONI FABBRICATI ESISTENTI	83 g	193'339,67																														
5	PREPARAZIONE DELLE AREE	14 g	41'698,70																														
6	SCAVI PER OPERE STRUTTURALI	21 g	103'161,49																														
7	OPERE IN C.A.	125 g	967'811,81																														
8	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	80 g	616'432,19																														
9	TAMPONATURE E TRAMEZZATURE	52 g	291'008,34																														
10	IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZION...	7 g	19'423,35																														
11	PACCHETTO DI COPERTURA TIPO S5 e S6	30 g	137'244,94																														
12	PACCHETTO DI COPERTURA TIPO S8	8 g	18'141,87																														
13	RIVESTIMENTO FACCIATA PALESTRA	76 g	284'850,11																														
14	OPERE DA LATTONIERE	7 g	15'225,07																														
15	COIBENTAZIONE DEL SOLAIO CONTROTERRA	16 g	94'971,39																														
16	PAVIMENTAZIONE INTERNA IN CEME...	11 g	42'407,20																														
17	PAVIMENTAZIONE INTERNA IN LINOLEUM	48 g	165'319,40																														
18	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN CEME...	8 g	15'805,12																														
19	ZOCCOLINI E RIVESTIMENTO BAGNI	16 g	41'485,56																														
20	CONTROSOFFITTO	82 g	221'914,52																														
21	OPERE DI FINITURA INTERNE	33 g	38'077,01																														
22	OPERE DA FABBRO	7 g	10'781,73																														
23	INFISSI INTERNI	8 g	28'665,66																														
24	INFISSI ESTERNI	41 g	271'349,58																														
25	SISTEMAZIONE ESTERNA	3 g	4'571,40																														
26	ASCENSORE	23 g	49'740,00																														
27	IMPIANTI MECCANICI	225 g	582'621,39																														
28	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	269 g	539'885,87																														
29	LAVORAZIONI IN ECONOMIA	524 g	43'066,63																														
30	OPERE PER LA SICUREZZA	524 g	71'000,00																														
31	COLLAUDO	60 g	0,00																														
32	COLLAUDO E CONSEGNA DELLE OPERE	60 g	0,00																														

COMMITTENTE:

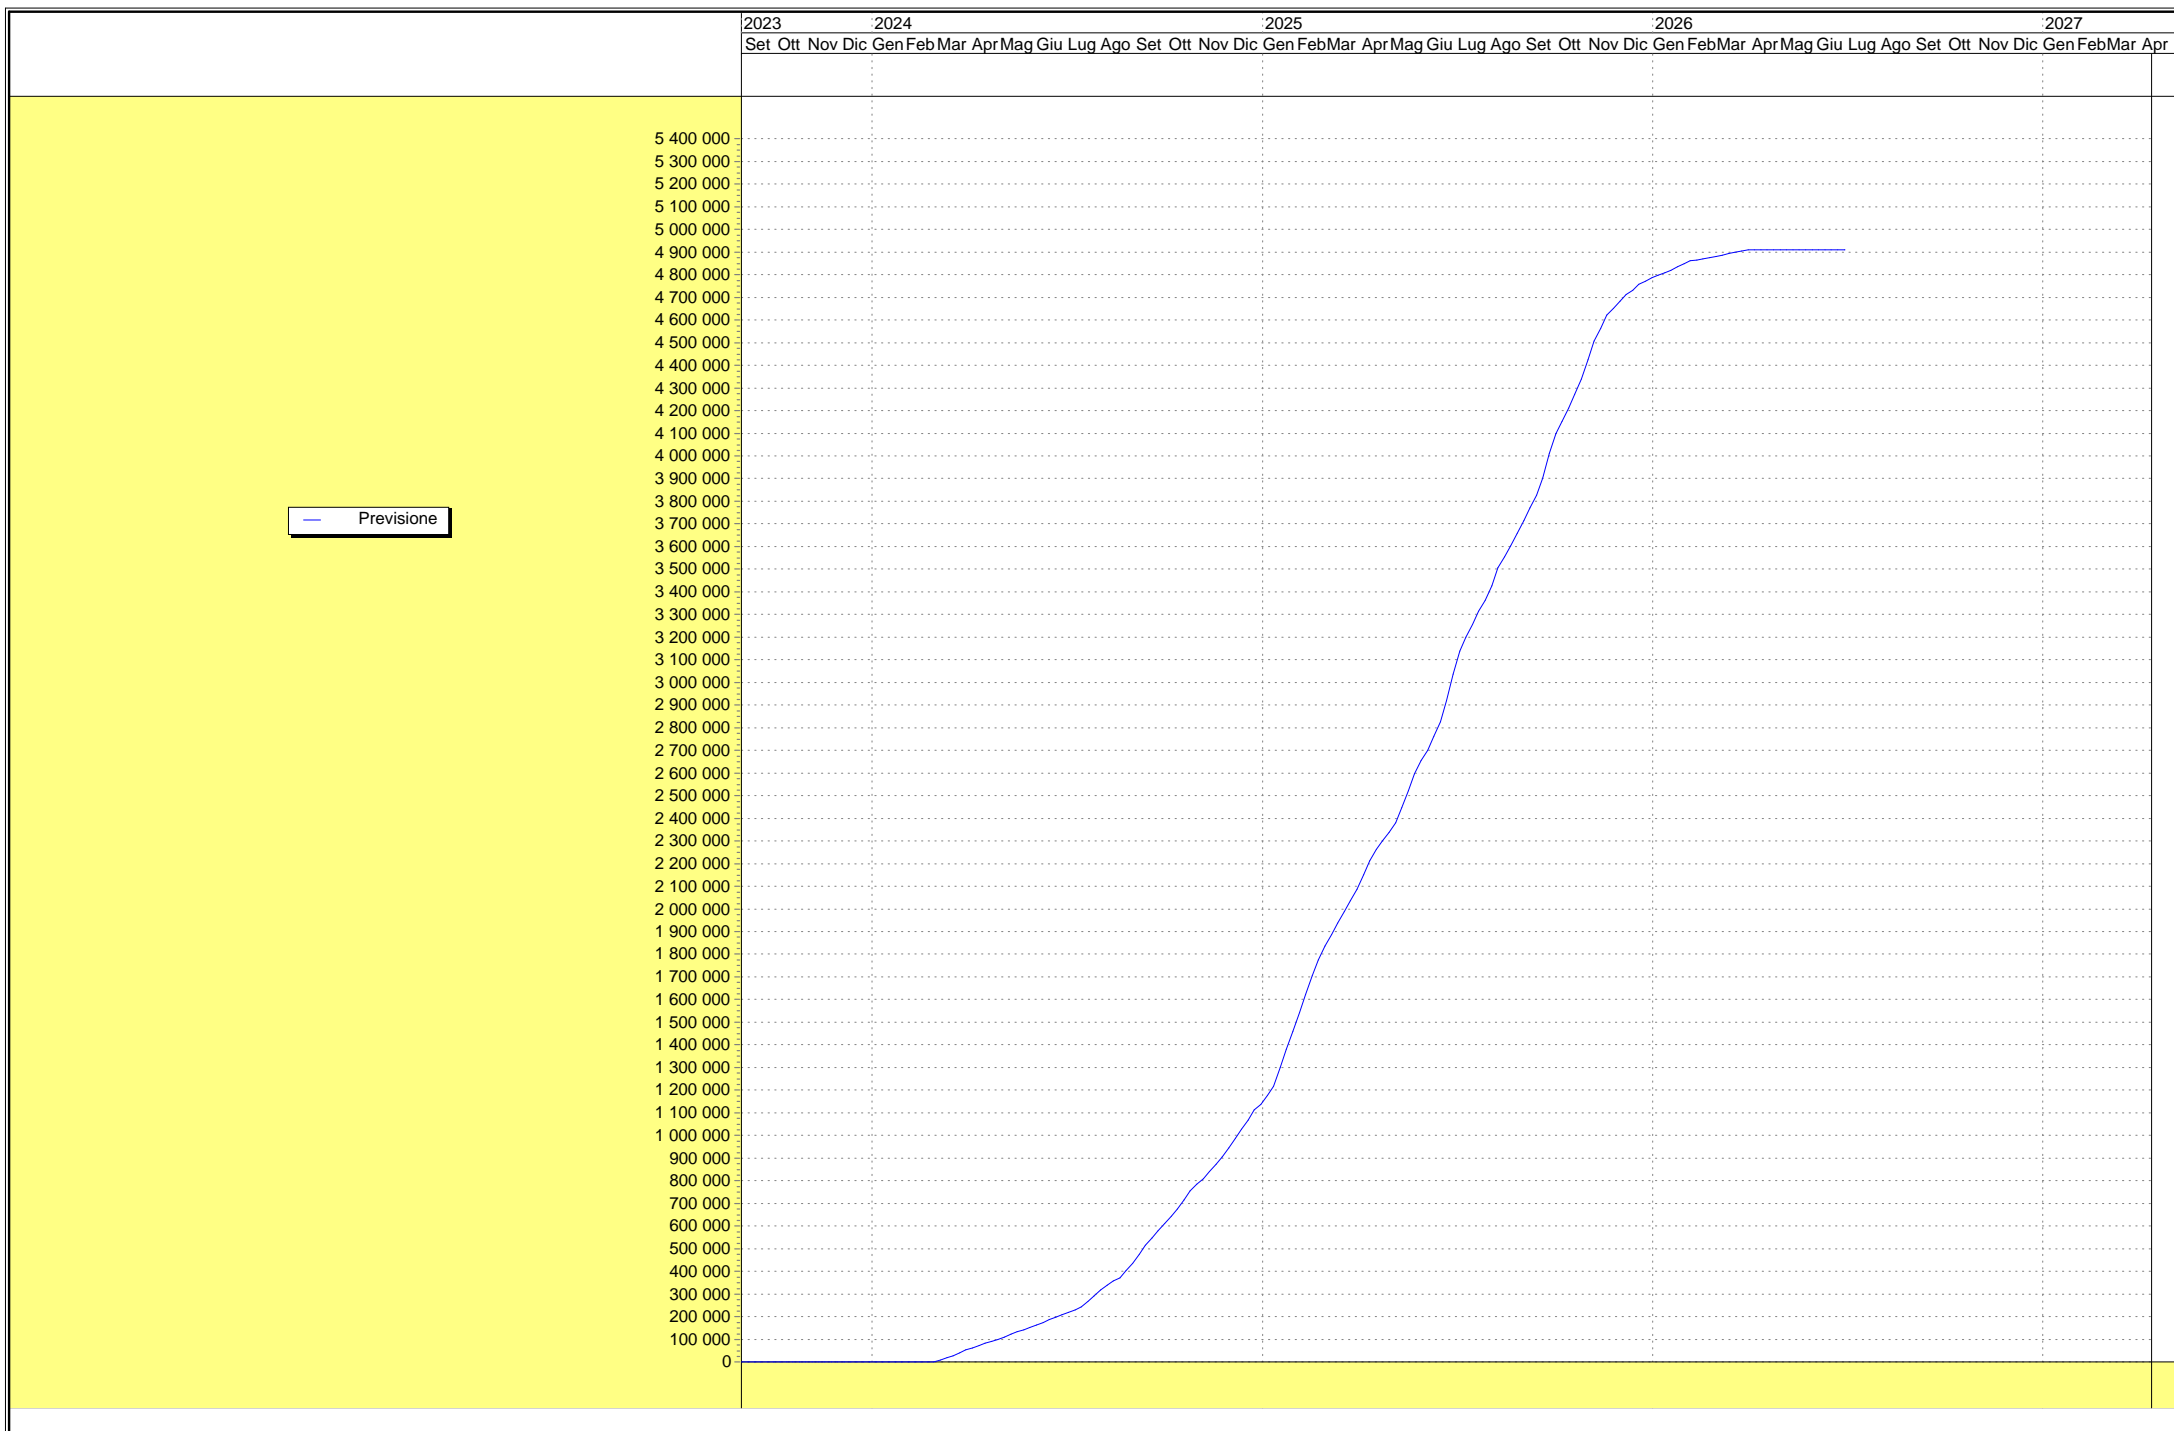

## PROVINCIA DI RAVENNA

# Tabella Attività

**OGGETTO:** PROGETTO I.P.S. OLIVETTI-CALLEGARI

**COMMITTENTE:**

, 15/06/2023

Il Tecnico  
( )

---

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>AGGIUDICAZIONE LAVORI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>126</b>	<b>183</b>
* GARA D'APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI	0,00	0,000	01/09/2023	01/03/2024	126	183
<b>LAVORI</b>	<b>4'910'000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>31/03/2026</b>	<b>524</b>	<b>761</b>
* DEMOLIZIONI FABBRICATI ESISTENTI	193'339,67	3,938	01/03/2024	28/06/2024	83	120
* PREPARAZIONE DELLE AREE	41'698,70	0,849	02/07/2024	19/07/2024	14	18
* SCAVI PER OPERE STRUTTURALI	103'161,49	2,101	18/07/2024	16/08/2024	21	30
* OPERE IN C.A.	967'811,81	19,711	20/08/2024	17/02/2025	125	182
* OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	616'432,19	12,555	14/01/2025	08/05/2025	80	115
* TAMPONATURE E TRAMEZZATURE	291'008,34	5,927	09/05/2025	22/07/2025	52	75
* IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONE E MARCIAPIEDE ESTERNO	19'423,35	0,396	23/12/2024	03/01/2025	7	12
* PACCHETTO DI COPERTURA TIPO S5 e S6	137'244,94	2,795	05/05/2025	16/06/2025	30	43
* PACCHETTO DI COPERTURA TIPO S8	18'141,87	0,369	18/06/2025	27/06/2025	8	10
* RIVESTIMENTO FACCIATA PALESTRA	284'850,11	5,801	18/06/2025	02/10/2025	76	107
* OPERE DA LATTONIERE	15'225,07	0,310	17/06/2025	25/06/2025	7	9
* COIBENTAZIONE DEL SOLAIO CONTROTERRA	94'971,39	1,934	16/06/2025	07/07/2025	16	22
* PAVIMENTAZIONE INTERNA IN CEMENTO INDUSTRIALE	42'407,20	0,864	25/07/2025	08/08/2025	11	15
* PAVIMENTAZIONE INTERNA IN LINOLEUM	165'319,40	3,367	25/07/2025	01/10/2025	48	69
* PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN CEMENTO INDUSTRIALE	15'805,12	0,322	30/09/2025	09/10/2025	8	10
* ZOCCOLINI E RIVESTIMENTO BAGNI	41'485,56	0,845	17/10/2025	07/11/2025	16	22
* CONTROSOFFITTO	221'914,52	4,520	09/10/2025	06/02/2026	82	121
* OPERE DI FINITURA INTERNE	38'077,01	0,775	13/02/2026	31/03/2026	33	47
* OPERE DA FABBRO	10'781,73	0,220	19/09/2025	29/09/2025	7	11
* INFISSI INTERNI	28'665,66	0,584	22/09/2025	01/10/2025	8	10
* INFISSI ESTERNI	271'349,58	5,526	24/09/2025	19/11/2025	41	57

COMMITTENTE:  
TABELLA DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* SISTEMAZIONE ESTERNA	4'571,40	0,093	01/12/2025	03/12/2025	3	3
* ASCENSORE	49'740,00	1,013	22/08/2025	23/09/2025	23	33
* IMPIANTI MECCANICI	582'621,39	11,866	17/01/2025	04/12/2025	225	322
* IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	539'885,87	10,996	06/12/2024	05/01/2026	269	396
* LAVORAZIONI IN ECONOMIA	43'066,63	0,877	01/03/2024	31/03/2026	524	761
* OPERE PER LA SICUREZZA	71'000,00	1,446	01/03/2024	31/03/2026	524	761
<b>COLLAUDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>03/04/2026</b>	<b>30/06/2026</b>	<b>60</b>	<b>89</b>
* COLLAUDO E CONSEGNA DELLE OPERE	0,00	0,000	03/04/2026	30/06/2026	60	89
Data, 15/06/2023						
Tecnico						
