



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Ravenna

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio Programmazione e Progettazione

LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI NR.1/2 DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI NR.24/26 - LUGO (RA) - CUP J41B22001670004 - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU PNRR

Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

PROGETTO ESECUTIVO

Presidente: Michele de Pascale		Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Maria Luisa Martinez	
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Marco Conti		Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Arch. Giovanna Garzanti	firmato digitalmente
PROGETTISTA COORDINATORE:	Arch. Sara Saliba	firmato digitalmente
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:	Arch. Sara Saliba	firmato digitalmente
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE:	Geom. Matteo Montuschi	
ELABORAZIONE GRAFICA:	Geom. Matteo Montuschi	
Professionisti esterni:			
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:	Ing. Massimo Rosetti		
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:	Ing. Davide Lucchi		
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:	Ing. Patrizio Berretti		
PROGETTAZIONE ACUSTICA:	Ing. Letizia Pretolani		
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Ing. Massimo Rosetti		
PROGETTISTA ANTINCENDIO:	Ing. Patrizio Berretti		
ESPERTO CAM IN EDILIZIA:	Arch. Gino Mazzone		










































Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
0	EMISSIONE	MR	SS	GG	03/07/2023
1					
2					
3					

TITOLO
ELABORATO:
CRONOPROGRAMMA

PROFESSIONISTA RESPONSABILE:
Titolo Nome e Cognome


FIRMATO DIGITALMENTE
.....
Timbro e firma del Professionista

Elaborato num: SIC 06	Revisione: 00	Data: 03/07/2023	Scala:	Nome file: PE_SIC_06_CRONO_r.00.pdf
-----------------------------	------------------	---------------------	--------	---

LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI NR.1/2 DELPOLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI NR.24/26																																				
ID		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Cronoprogramma Lavori																														
						novembre					dicembre					gennaio					febbraio					marzo					aprile					
						30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12	25/12	01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	04/03	11/03	18/03	25/03	01/04	08/04	15/04						
1		Preparazione area e Accantieramento Via Lumagni	5 g	mar 07/11/23	lun 13/11/23																															
2		Montaggio gru edile	3 g	mar 14/11/23	gio 16/11/23																															
3		Scavo e sbancamento	7 g	ven 17/11/23	lun 27/11/23																															
4		Platea di fondazione	7 g	mar 28/11/23	mer 06/12/23																															
5		Montaggio ponteggi	7 g	gio 07/12/23	ven 15/12/23																															
6		Realizzazione struttura in c.a.	120 g	lun 18/12/23	ven 31/05/24																															
7		Realizzazione solai di piano e copertura	60 g	lun 11/03/24	ven 31/05/24																															
8		Montaggio strutture portanti metalliche (scala emergenza+ampliamento)	40 g	lun 03/06/24	ven 26/07/24																															
9		Impermeabilizzazione e coibentazione solai	15 g	lun 29/07/24	ven 16/08/24																															
10		Pareti di tamponamento	30 g	lun 19/08/24	ven 27/09/24																															
11		Sott e pavimenti e riv.	30 g	lun 30/09/24	ven 08/11/24																															
12		Pareti in cartongesso	30 g	lun 11/11/24	ven 20/12/24																															
13		Impianto elettrico	30 g	lun 23/12/24	ven 31/01/25																															
14		Imp. Idro termo sanitario e climatizzazione	40 g	lun 03/02/25	ven 28/03/25																															
15		Posa di Soglie e bancali	15 g	lun 31/03/25	ven 18/04/25																															
16		Intonaci	20 g	lun 21/04/25	ven 16/05/25																															
17		Posa serramenti interni ed esterni	15 g	lun 19/05/25	ven 06/06/25																															
18		Opere di lattoneria	15 g	lun 09/06/25	ven 27/06/25																															
19		Installazione di parapetti e ringhiere perimetrali in copertura	7 g	lun 30/06/25	mar 08/07/25																															
20		Pannelli Fotovoltaici	15 g	mer 09/07/25	mar 29/07/25																															
21		Tinteggiature	15 g	mar 20/05/25	lun 09/06/25																															
22		Installazione sanitari	7 g	mar 10/06/25	mer 18/06/25																															
23		Cabina Elettrica	30 g	lun 23/12/24	ven 31/01/25																															
24		Impianto elettrico cabina	30 g	lun 03/02/25	ven 14/03/25																															
25		Fognature e sistemazioni esterne	15 g	gio 19/06/25	mer 09/07/25																															
26		Piantumazione e sistemazione verde	7 g	gio 10/07/25	ven 18/07/25																															
27		Finiture varie	7 g	ven 20/06/25	lun 30/06/25																															
28		Smobilizzo cantiere Via Lumagni	3 g	lun 21/07/25	mer 23/07/25																															
29		Preparazione area e Accantieramento Via Brunelli-Viale Tullio Masi	3 g	gio 24/07/25	lun 28/07/25																															
30		Demolizione fabbricato e impiantistica	20 g	mar 29/07/25	lun 25/08/25																															
31		Scavo e sbancamento	7 g	mar 26/08/25	mer 03/09/25																															
32		Smobilizzo cantiere Via Brunelli-Viale Tullio Masi	2 g	gio 04/09/25	ven 05/09/25																															
Data: ven 03/07/23		Attività		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Solo inizio		Scadenza																										
		Divisione		Cardine esterno		Attività manuale		Solo fine																												
		Cardine		Attività inattiva		Solo-durata		Attività esterne																												
		Riepilogo		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Cardine esterno																												
		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento																												
Ing. Rosetti Massimo																																				

Cronoprogramma Lavori


LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI NR.1/2 DELPOLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI NR.24/26

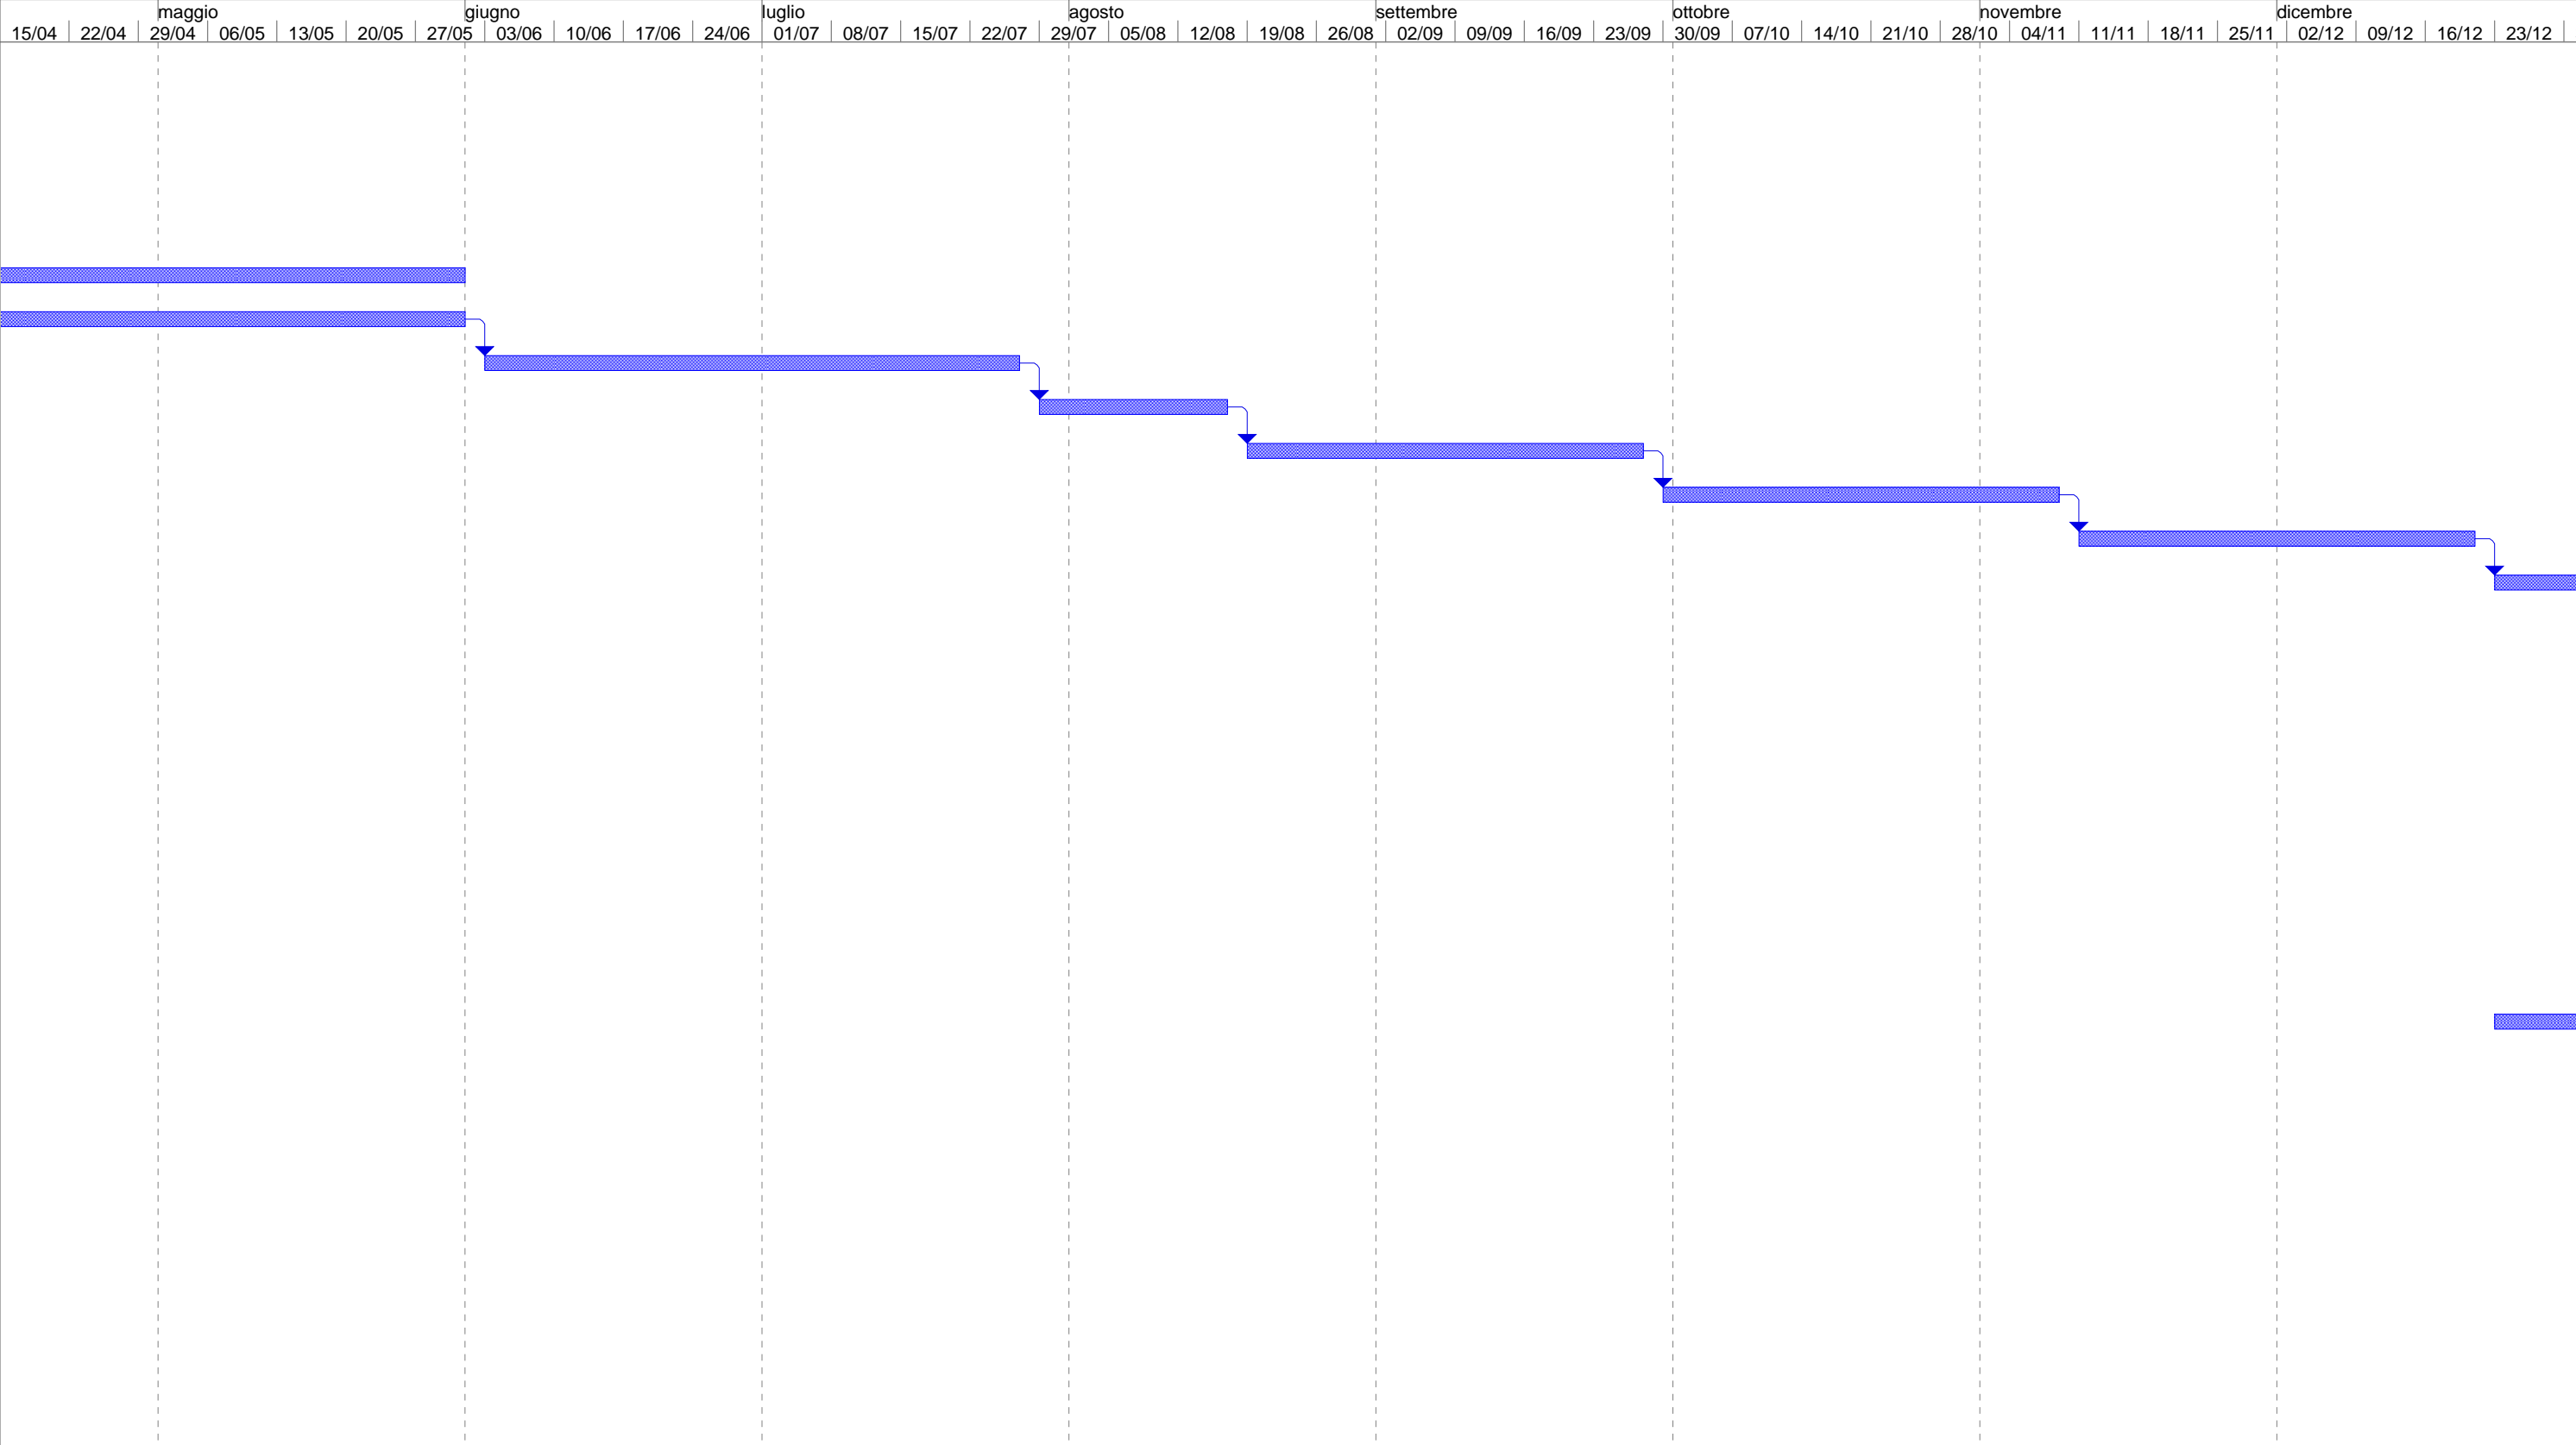

Data: ven 03/07/23	Attività		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Cardine esterno		Attività manuale		Solo-fine			
	Cardine		Attività inattiva		Solo-durata		Attività esterne			
	Riepilogo		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Cardine esterno			
	Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento			

Ing. Rosetti Massimo

Cronoprogramma Lavori
LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI NR.1/2 DELPOLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI NR.24/26

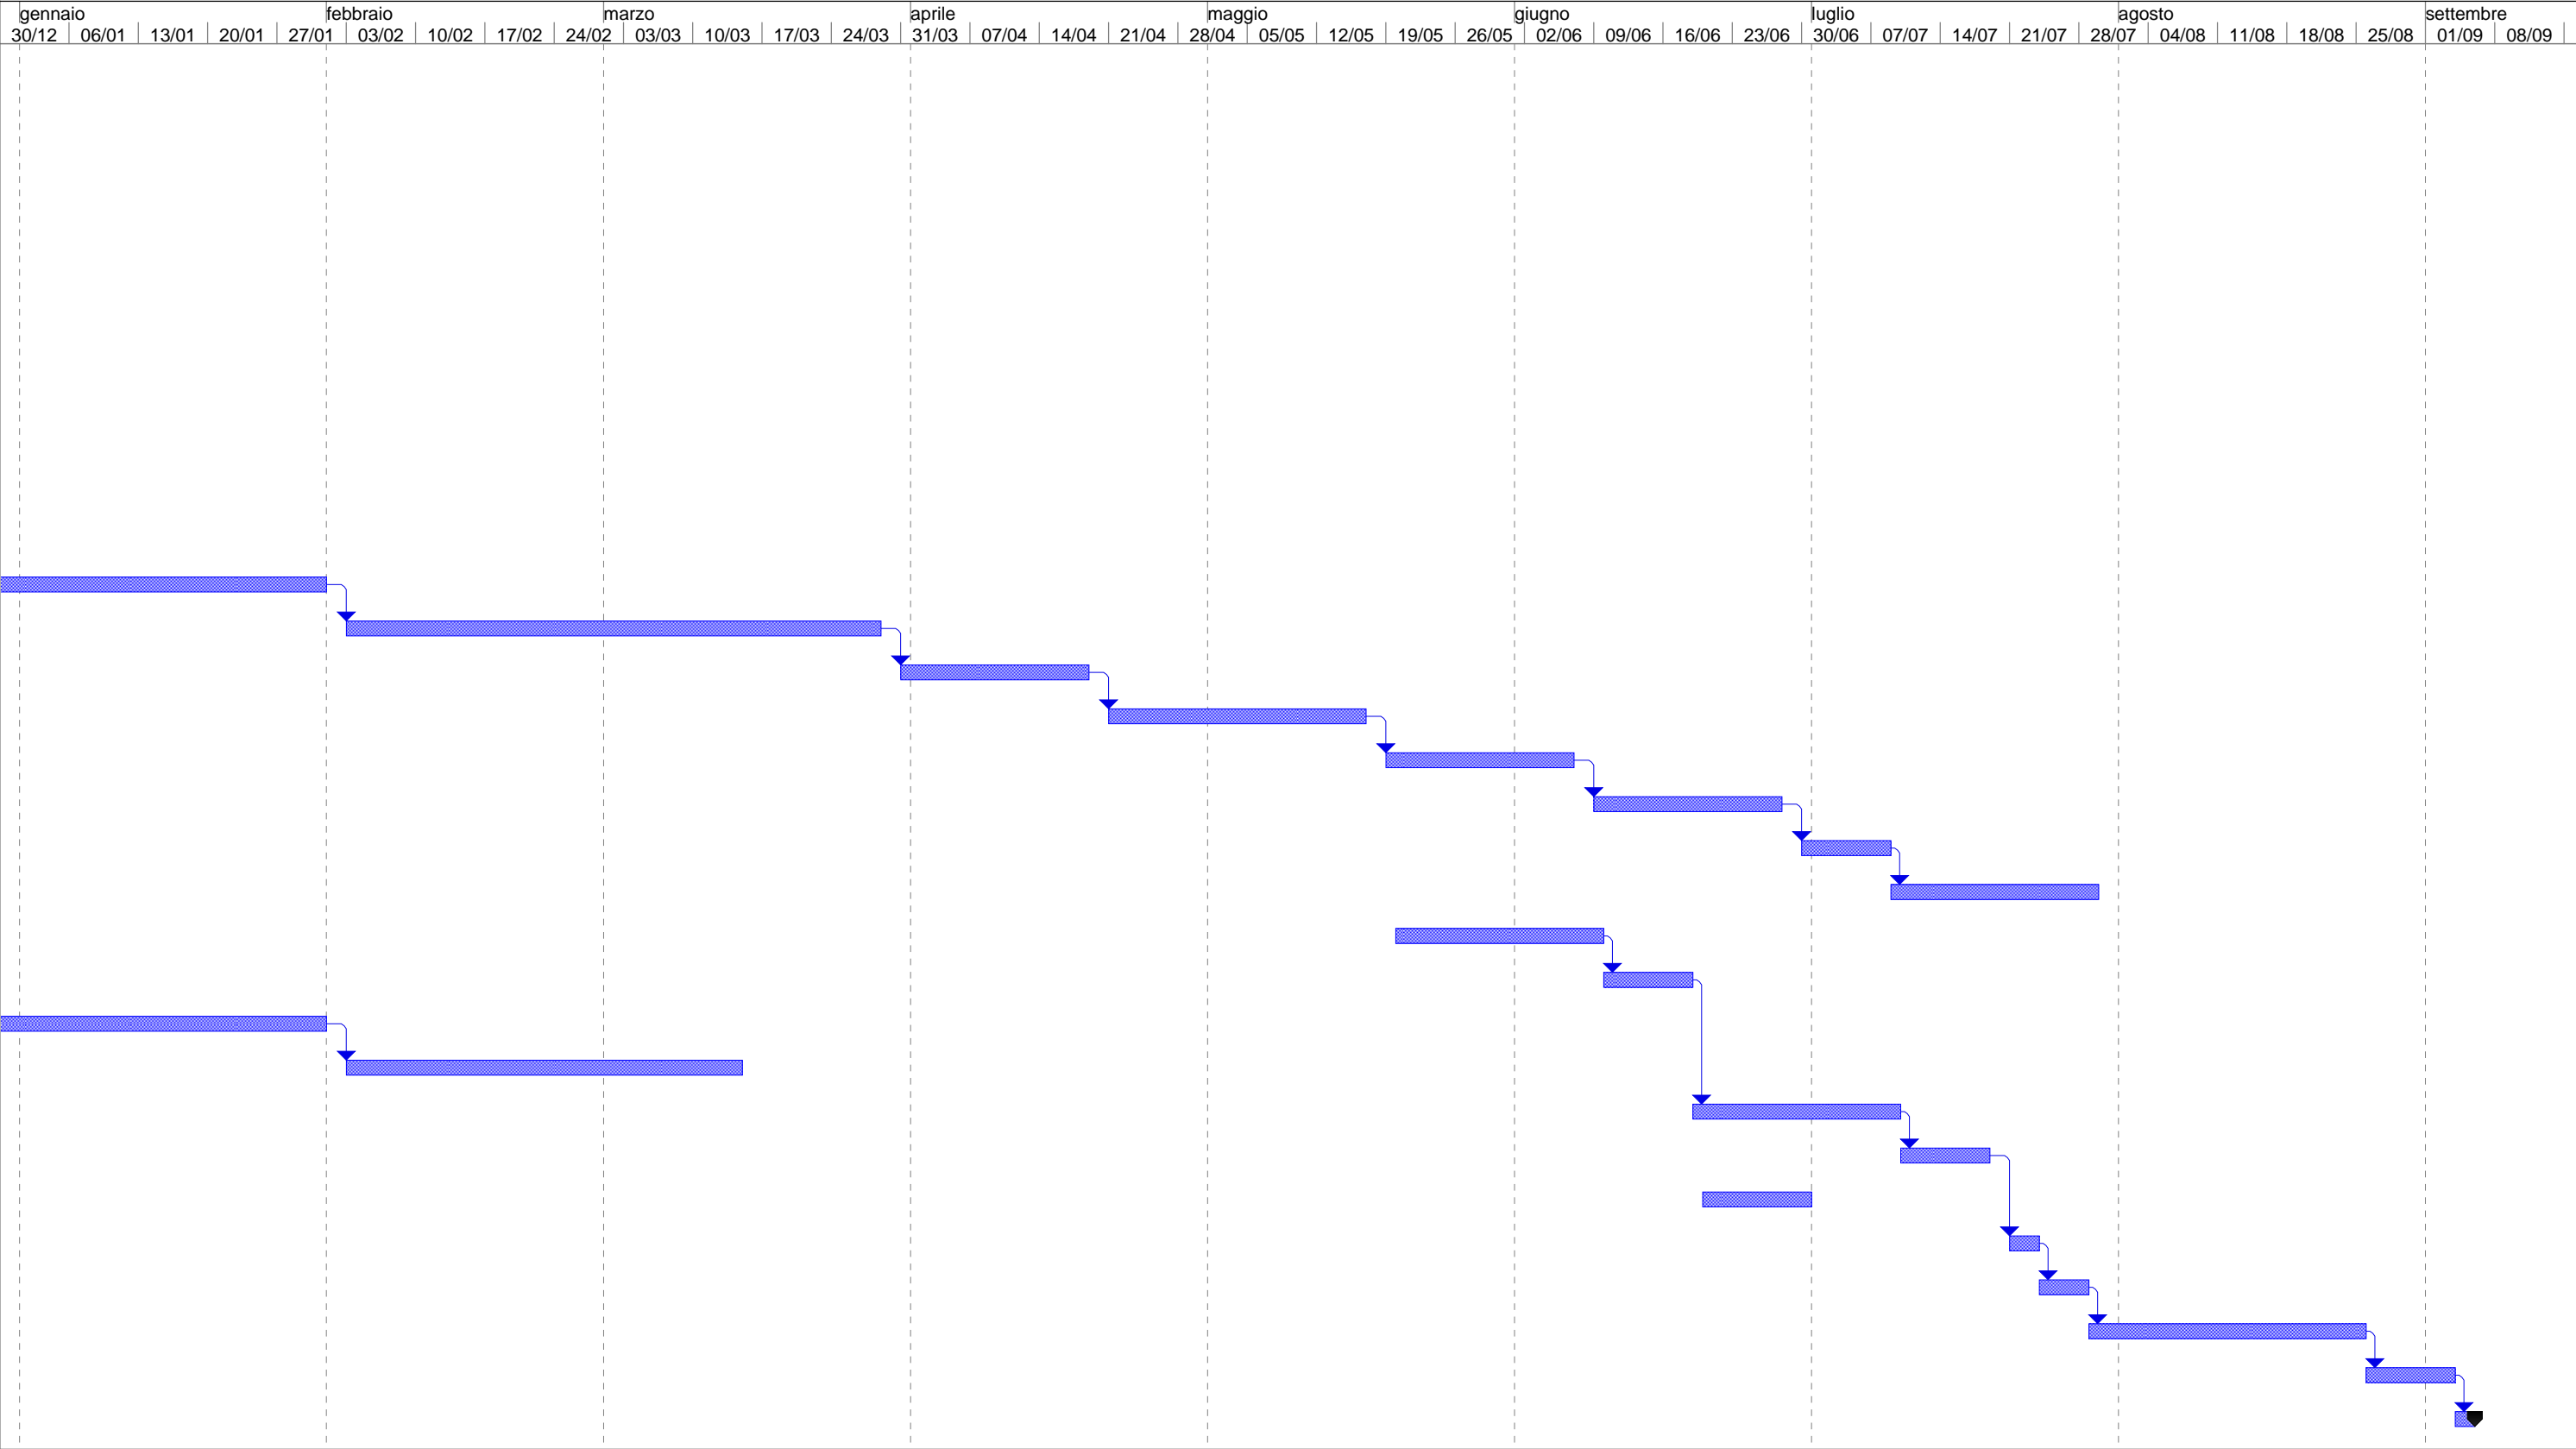

Data: ven 03/07/23	Attività		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Cardine esterno		Attività manuale		Solo-fine			
	Cardine		Attività inattiva		Solo-durata		Attività esterne			
	Riepilogo		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Cardine esterno			
	Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riepilogo manuale		Avanzamento			

Ing. Rosetti Massimo
